



TECHNICAL ASSISTANCES








CODE	NAME CGI	PROJECT	CUSTOMER	LOCATION	DATE
11020	CSS WEST ESPLANADE	Health and safety coordination in the works of the West Esplanade extension, in Playa de Poniente (Parque de Elche)	BENIDORM COUNCIL	Benidorm	2011
11009	CSS PAINTING	Painting and repainting vials brands, Benidorm	BENIDORM COUNCIL	Benidorm	2011
10064	Control of the work, ELDA PETRER, Villena	Technical assistance works in "Works in commercial zone, urban area, and improve and design of different streets in Villena (Alicante)".	Ministry of Transports and Infrastructures	ELDA	2011
10064	C.W. ELDA PETRER, Villena	Technical assistance works in "Country planning in solar in front of the Public School Reyes Catolicos in Elda (Alicante)"	Ministry of Transports and Infrastructures	PETRER	2011
10064	C.W. ELDA PETRER Villena	Technical assistance works in "Adaptation and improvement in two roundabouts in Elda (Alicante)"	Ministry of Transports and Infrastructures	PETRER	2011
10064	T.A.W . ELDA PETRER Villena	Technical assistance works in "fencing and urbanization of the area plot of public facility designed to center Alzheimer in Elda (Alicante)"	Ministry of Transports and Infrastructures	PETRER	2011
10064	T.A.W . ELDA PETRER Villena	Technical assistance works in "Restoration in parks and Public gardens in San Francisco de sales, Elda (Alicante)"	Ministry of Transports and Infrastructures	ELDA	2011
10064	C.W. ELDA PETRER Villena	Technical assistance works in "Restoration in parks and Concordia Public gardens, and other works in Elda (Alicante)"	Ministry of Transports and Infrastructures	ELDA	2011
10064	T.A.W . ELDA PETRER Villena	Technical assistance works in "Works of re-paving in Huerta Nueva neighborhood and Sax Avenue, Elda (Alicante)"	Ministry of Transports and Infrastructures	ELDA	2011
10055	CSS traffic light network	Health and safety control in the works of traffic light network improvement, and traffic control in Benidorm (Alicante)	BENIDORM COUNCIL	Benidorm	2010
10051	RURAL AREAS CSS	Health and safety coordination in the improvement of the road safety works in rural areas of Benidorm (Alicante)	BENIDORM COUNCIL	Benidorm	2010


CODE	NAME CGI	PROJECT	CUSTOMER	LOCATION	DATE
10050	Bilbao Avenue, Health and Safety	Health and safety coordination in the improvement of the Public Lighting Energy efficiency in Bilbao Avenue, Benidorm (Alicante)	BENIDORM COUNCIL	Benidorm	2010
10049	FIBER OPTIC, H&S	Health and safety coordination in the Network Municipal Optical Fiber Communication expanding, Benidorm (Alicante)	BENIDORM COUNCIL	Benidorm	2010
10040	LA CALA – PONIENTE H&S	Health and safety coordination in the improvement of the road safety works in La Cala, West Benidorm (Alicante)	BENIDORM COUNCIL	Benidorm	2010
10032	West Benidorm- city center Benidorm H&S	Health and safety coordination in the improvement of the road safety works in the central and west zones in Benidorm (Alicante)	BENIDORM COUNCIL	Benidorm	2010
10009	DO CB PEDREGUER	Technical assistance works in the Pedreguer Cyclist itinerary (Alicante)	ALICANTE COUNTY COUNCIL	Pedreguer	2010
10008	TAW. PILAR DE LA HORADADA	Technical assistance works for the improvement of paving in the Subdivision of Casicas, Pilar de la Horadada (Alicante)	Ministry of Transports and Infrastructures	Pilar Horadada	2012
10008	TAW. PILAR DE LA HORADADA	Technical assistance works in footbridge on watercourse works, in Pilar de la Horadada.	Ministry of Transports and Infrastructures	Pilar Horadada	2011
10008	TAW. PILAR DE LA HORADADA	Technical assistance works in paving improvement in “LOS SEGUNDOS” neighborhood, Pilar de la Horadada (Alicante)	Ministry of Transports and Infrastructures	Pilar Horadada	2011
10008	TAW. PILAR DE LA HORADADA	Technical assistance works in paving improvement in several streets of Pilar of the Horadada (Alicante)	Ministry of Transports and Infrastructures	Pilar Horadada	2010
9031	Health and safety coordination for the comprehensive renovation of the neighborhood Calvario, Benidorm	Health and safety coordination for comprehensive renovation of the neighborhood Calvario, Benidorm	BENIDORM COUNCIL	Benidorm	2009




CODE	NAME CGI	PROJECT	CUSTOMER	LOCATION	DATE
9030	Health and safety coordination for the vehicular traffic improvement in the old quarter of Benidorm	Health and safety coordination for the vehicular traffic improvement in the old quarter of Benidorm	BENIDORM COUNCIL	Benidorm	2009
8035	T.A.W. ROUNDABOUT "LAS MAROMAS", Almoradí	Technical assistance works in conditioning and improvement works in the road CV-935. Urban Area - P. I. "Las Maromas ", Almoradí	Almoradi council	Almoradi	2008
8035	H.S. Las Maromas	Health and safety coordination for carrying out conditioning and improvement works in the road CV-935. Urban Area - P. I. "Las Maromas" , Almoradí	Almoradicouncil	Almoradi	2008
8030	Health and safety coordination for new roundabout construction works, in the CV- 95. San Miguel SalinasMunicipal area	Health and safety coordination for execution of the roundabout project "connection CV-95 with Los Invernaderos urban area (SUS-A),	San Miguel Salinas AIU	San Miguel de Salinas	2008
8029	H.and S. FGV- CreuetaCampello	Health and safety coordination for the different necessary operations for optimization of the track section between The Campello and Creueta , line Alicante- Denia.	RAILROADS OF THE VALENCIAN GENERALITAT	Alicante	2008
8028	Technical assistance works in execution of the new roundabout on the CV-95. Municipal Area St. Miguel Salinas	Project Management of the roundabout connection "CV-95 to urbanization SUS- A Los Invernaderos" construction,	A.I. U. San Miguel Salinas	San Miguel Salinas	2008
7048	T.A.W. in New Crossover San Felipe Neri, Crevillente	Health and safety coordination for the new crossover in San Felipe Neri, Crevillente	Ministry of Transports and Infrastructures	Crevillente	2008
7028	T.A.W. in urbanizing execution UE3 in Novelda, Alicante	T.A.W. in urbanizing execution UE3 in Novelda, Alicante	A.I.U. EU- 3 Industrial	Alicante	2008




WORK:	CUSTOMER:			
10064 – DO-ELDA PETRER VILLENA-VILLENA	Transports and Infrastructures Council			
PROJECT NAME:				
<p>TECHNICAL ASSISTANCE WORKS IN "WORKS IN COMMERCIAL ZONE, URBAN AREA, AND IMPROVE AND DESIGN OF DIFFERENT STREETS IN VILLENA (ALICANTE)".</p>			FILE No.:	CMAYOR/2010/09/20
			YEAR:	2011
WORK IN PICTURES:	WORK DESCRIPTION:			
	<p>During the execution, the works carried out were technical assistance work, visiting work, writing records request documentation, monthly reporting, etc</p>			
				




WORK:	CUSTOMER:			
10064 – T.A.W.-ELDA PETRER VILLENA-REYES CATHOLIC	Transports and Infrastructures Council			
PROJECT NAME:				
TECHNICAL ASSISTANCE WORKS IN "COUNTRY PLANNING IN SOLAR IN FRONT OF THE PUBLIC SCHOOL REYES CATÓLICOS IN ELDA (ALICANTE)"			FILE No.:	CMAYOR/2010/09/13
			YEAR:	2011
WORK IN PICTURES:	WORK DESCRIPTION:			
	During the execution, the works carried out were technical assistance work, visiting work, writing records request documentation, monthly reporting, etc			
			 <p>ACONDICIONAMIENTO SOLAR FRENTE A C.P. REYES CATÓLICOS</p>	




WORK:	CUSTOMER:			
10064 – DO-ELDA PETRER VILLENA-DOS GLORIETAS	Transports and Infrastructures Council			
PROJECT NAME:				
TECHNICAL ASSISTANCE WORKS IN "ADAPTATION AND IMPROVEMENT IN TWO ROUNDABOUTS IN ELDA (ALICANTE)"			FILE No.:	CMAYOR/2010/09/18
			YEAR:	2011
WORK IN PICTURES:	WORK DESCRIPTION:			
	<p>During the execution, the works carried out were technical assistance work, visiting work, writing records request documentation, monthly reporting, etc</p>			
				




WORK:	CUSTOMER:			
10064 – DO-ELDA PETRER VILLENA-MOLINETA	Transports and Infrastructures Council Transports and Infrastructures Council			
PROJECT NAME:				
<p>TECHNICAL ASSISTANCE WORKS IN "FENCING AND URBANIZATION OF THE AREA PLOT OF PUBLIC FACILITY DESIGNED TO CENTER ALZHEIMER IN ELDA (ALICANTE)"</p>				
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="775 770 1031 831">FILE No.:</td> <td data-bbox="1031 770 1375 831">CMAYOR/2010/09/17</td> </tr> <tr> <td data-bbox="775 831 1031 882">YEAR:</td> <td data-bbox="1031 831 1375 882">2011</td> </tr> </table>			FILE No.:	CMAYOR/2010/09/17
FILE No.:	CMAYOR/2010/09/17			
YEAR:	2011			
WORK IN PICTURES:	WORK DESCRIPTION:			
 	<p>During the execution, the works carried out were technical assistance work, visiting work, writing records request documentation, monthly reporting, etc</p> 			



WORK:	CUSTOMER:
10064 – DO-ELDA PETRER VILLENA-SAN FRANCISCO	Transports and Infrastructures Council
PROJECT NAME:	 <p>GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE</p>
TECHNICAL ASSISTANCE WORKS IN "RESTORATION IN PARKS AND PUBLIC GARDENS IN SAN FRANCISCO DE SALES, ELDA (ALICANTE)"	
FILE No.:	
YEAR:	2011
WORK IN PICTURES:	WORK DESCRIPTION:

During the execution, the works carried out were technical assistance work, visiting work, writing records request documentation, monthly reporting, etc



REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES SAN FRANCISCO DE SALES EN EL MUNICIPIO DE ELDA



PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES


DESCRIPCIÓN ACTIVACIÓN:
 La actividad de este proyecto tiene por objeto la renovación del parque San Francisco de Sales para convertirlo en un espacio urbano integrado en el entorno. Al respecto, se pretende dar a conocer a los vecinos los trabajos que faciliten la integración y convivencia social.

El parque actualizado cuenta de una parte diferenciada respecto por su uso de contenidos que se basan en los principios de las actuaciones, la accesibilidad al lugar para la edad de la infancia, y para que operen en su entorno, tanto de día como en momentos de ocio y recreación. Por último, se crea un espacio de parque infantil Abierto que abarca a los usuarios de diferentes grupos. Entre otros, parque de Caba y Salsar Abierto, zonas de ocio urbano. Disponen de zonas de juegos para niños, La jardinería se realiza en función de las zonas que se van desarrollando.


Se obtiene que se van a hacer a saber a todos los ciudadanos.





- Limpieza y estado de árboles y patios del parque de Sales.
- Eliminación de los restos de cemento.
- Construcción de un área de juegos y mantenimiento por un mes anual.
- Construcción de zonas de juegos infantiles en áreas aptas para la disposición de patios de juegos en zonas de juego.
- Limpieza de ciudad.
- Limpieza de parques infantiles, parques y jardines.


ACTUACIONES DEL PLAN CONFIANZA A EJECUTAR POR LA C.C.T. EN EL MUNICIPIO DE ELDA	
OBRA	PRESUPUESTO
Rehabilitación parques y jardines San Francisco de Sales	600.000,00 €
Refuerzo estructural parcial en el edificio del Ayuntamiento	41.314,88 €
Renovación de la zona peatonal del mercado central	300.000,00 €
Rehabilitación funcional y pavimentación de barandas en el Mercado Central de Elda.	500.000,00 €
Reparación barrio Huerta Nueva	1.700.000,00 €
Rehabilitación de viviendas en barrio San Francisco de Sales	3.000.000 €
Rehabilitación parques y jardines Concordia, Juventud y varios	500.000,00 €
Obras accesibilidad barrio Virgen Salud	500.000,00 €
Rehabilitación parques y jardines El Mare	150.302,44 €
Rehabilitación parques y jardines Nuestra Fraternidad	419.277,04 €
TOTAL	4.754.894,36 €







WORK:	CUSTOMER:			
10064 – DO-ELDA PETRER VILLENA-CONCORDIA	Transports and Infrastructures Council			
PROJECT NAME:				
<p>TECHNICAL ASSISTANCE WORKS IN "RESTORATION IN PARKS AND CONCORDIA PUBLIC GARDENS, AND OTHER WORKS IN ELDA (ALICANTE)"</p>			FILE No.:	CMAYOR/2010/09/107
			YEAR:	2011
WORK IN PICTURES:	WORK DESCRIPTION:			
	<p>During the execution, the works carried out were technical assistance work, visiting work, writing records request documentation, monthly reporting, etc</p>			
				




WORK:	CUSTOMER:			
10064 – T.A.W. ELDA VILLENA-HUERTA PETRER	Transports and Infrastructures Council			
PROJECT NAME:				
TECHNICAL ASSISTANCE WORKS IN "WORKS OF RE-PAVING IN HUERTA NUEVA NEIGHBORHOOD AND SAX AVENUE, ELDA (ALICANTE)"			FILE No.:	CMAYOR/2010/09/103
			YEAR:	2011
WORK IN PICTURES:	WORK DESCRIPTION:			
	<p>During the execution, the works carried out were technical assistance work, visiting work, writing records request documentation, monthly reporting, etc</p>			
				

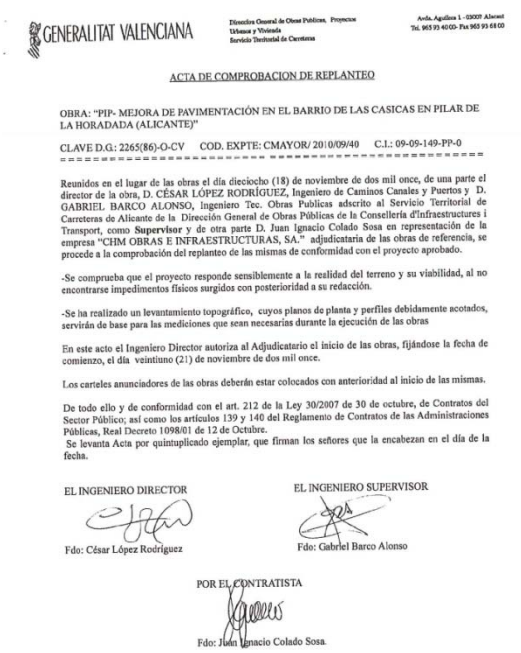


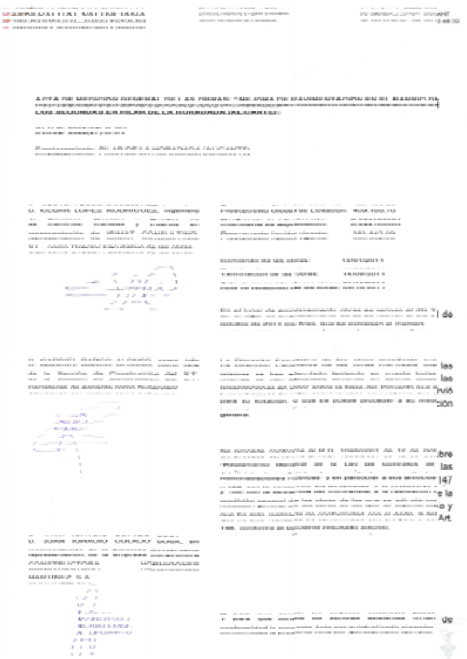



WORK:	CUSTOMER:
10008 – T.A.W. EL PILAR-CASICAS	Transports and Infrastructures Council
PROJECT NAME:	
<p>TECHNICAL ASSISTANCE WORKS IN "WORKS OF PAVING IN NEIGHBORHOOD LASCASICAS, IN PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE)".</p>	
WORK IN PICTURES:	
	FILE No.:
	YEAR: 2012
WORK IN PICTURES:	WORK DESCRIPTION:
	<p>During the execution, the works carried out were technical assistance work, visiting work, writing records request documentation, monthly reporting, etc</p>
	




WORK:	CUSTOMER:	
10008 – T.A.W. THE PILLAR-FOOTBRIDGE	Transports and Infrastructures Council	
PROJECT NAME:		
TECHNICAL ASSISTANCE WORKS IN "FOOTBRIDGE OVER GULLY IN PILAR DE LA HORADADA "		
FILE No:		
YEAR:	2011	
WORK IN PICTURES:	WORK DESCRIPTION:	
	During the execution, the works carried out were technical assistance work, visiting work, writing records request documentation, monthly reporting,	
		
		




<p>WORK:</p>	<p>CUSTOMER:</p>
<p>10008 – T.A.W. EL PILAR-SEGUNDAS</p>	<p>Transports and Infrastructures Council</p>
<p>PROJECT NAME:</p>	
<p>"IMPROVING PAVING IN LAS SEGUNDAS AREA, IN PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE).</p>	
<p>WORK IN PICTURES:</p>	
	<p>FILE No.: 2009/09/353</p> <p>YEAR: 2011</p>
	<p>WORK DESCRIPTION:</p> <p>During the execution, the works carried out were technical assistance work, visiting work, writing records request documentation, monthly reporting, etc.</p> 




WORK:	CUSTOMER:																																																	
10008 –T.A.W. SEVERAL STREETS IN PILAR HORADADA	Transports and Infrastructures Council																																																	
PROJECT NAME:																																																		
"IMPROVING ROAD PAVING IN SEVERAL STREETS IN PILAR DE LA HORADADA (ALICANTE) "			FILE No.:	2009/09/317																																														
			YEAR:	2010																																														
WORK IN PICTURES:	WORK DESCRIPTION:																																																	
	<p>During the execution, the works carried out were technical assistance work, visiting work, writing records request documentation, monthly reporting, etc.</p>																																																	
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="834 1451 1038 1480">GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE</td> <td colspan="2" data-bbox="1098 1451 1318 1480">CERTIFICACIÓN DE OBRA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="834 1496 970 1503">Expediente:</td> <td data-bbox="983 1496 1007 1503">2009/09/317</td> <td data-bbox="983 1496 1007 1503">C.I.</td> <td data-bbox="1054 1496 1129 1503">09-09-96-PP-0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="834 1503 970 1509">Programa:</td> <td data-bbox="983 1503 1038 1509">Proyecto Pto: FN-510</td> <td data-bbox="983 1503 1007 1509">Clave:</td> <td data-bbox="1054 1503 1110 1509">2265(35)-B-CV</td> </tr> <tr> <td data-bbox="834 1509 970 1516">Código:</td> <td data-bbox="983 1509 1038 1516">Certificación ORDINARIA</td> <td data-bbox="983 1509 1007 1516">Núm.:</td> <td data-bbox="1054 1509 1078 1516">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="834 1516 970 1523">Mes de:</td> <td colspan="3" data-bbox="983 1516 1129 1523">JUNIO de 2010</td> </tr> <tr> <td data-bbox="834 1597 890 1603">FECHA DE:</td> <td data-bbox="903 1597 970 1603">Licitación:</td> <td data-bbox="1031 1597 1078 1603">14/12/2010</td> <td data-bbox="1145 1509 1375 1538">SERVICIO TERRITORIAL DE CARRETERAS DE</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="903 1603 970 1610">Comienzo:</td> <td data-bbox="1031 1603 1078 1610">14/06/2010</td> <td data-bbox="1145 1538 1375 1568">DESIGNACION DE LA OBRA:</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="903 1610 970 1617">Finalización:</td> <td data-bbox="1031 1610 1078 1617">15/09/2010</td> <td data-bbox="1145 1568 1375 1597">PIP MEJORA DE PAVIMENTACION DE VARIAS C</td> </tr> <tr> <td data-bbox="834 1617 970 1624">Coeficiente de Adjudicación:</td> <td colspan="3" data-bbox="983 1617 1129 1624">0,8678091</td> </tr> <tr> <td data-bbox="834 1624 970 1630">Fórmula (s) tipo de revisión:</td> <td colspan="3" data-bbox="983 1624 1129 1630">-----</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1145 1597 1375 1626">Adjudicatario:</td> <td colspan="2" data-bbox="1222 1626 1375 1655">TARANCON GESTION DE OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U.</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1145 1626 1375 1655">DNICIF:</td> <td colspan="2" data-bbox="1222 1655 1375 1684">B-51149406</td> </tr> </table>		GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE		CERTIFICACIÓN DE OBRA		Expediente:	2009/09/317	C.I.	09-09-96-PP-0	Programa:	Proyecto Pto: FN-510	Clave:	2265(35)-B-CV	Código:	Certificación ORDINARIA	Núm.:	1	Mes de:	JUNIO de 2010			FECHA DE:	Licitación:	14/12/2010	SERVICIO TERRITORIAL DE CARRETERAS DE		Comienzo:	14/06/2010	DESIGNACION DE LA OBRA:		Finalización:	15/09/2010	PIP MEJORA DE PAVIMENTACION DE VARIAS C	Coeficiente de Adjudicación:	0,8678091			Fórmula (s) tipo de revisión:	-----				Adjudicatario:	TARANCON GESTION DE OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U.			DNICIF:	B-51149406	
GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE		CERTIFICACIÓN DE OBRA																																																
Expediente:	2009/09/317	C.I.	09-09-96-PP-0																																															
Programa:	Proyecto Pto: FN-510	Clave:	2265(35)-B-CV																																															
Código:	Certificación ORDINARIA	Núm.:	1																																															
Mes de:	JUNIO de 2010																																																	
FECHA DE:	Licitación:	14/12/2010	SERVICIO TERRITORIAL DE CARRETERAS DE																																															
	Comienzo:	14/06/2010	DESIGNACION DE LA OBRA:																																															
	Finalización:	15/09/2010	PIP MEJORA DE PAVIMENTACION DE VARIAS C																																															
Coeficiente de Adjudicación:	0,8678091																																																	
Fórmula (s) tipo de revisión:	-----																																																	
	Adjudicatario:	TARANCON GESTION DE OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U.																																																
	DNICIF:	B-51149406																																																



WORK:	CUSTOMER:
09060 – T.A.W. Pedreguer Cycling Itinerary	HON. County Council, Alicante
PROJECT NAME:	
T.A.W., ACCESSIBILITY IMPROVEMENT and URBANIZATION WORKS IN THE K.P. CV-746 7 +650 TO 8 +750 OF M. AREA, TEULADA	
WORK IN PICTURES:	FILE No.:
	YEAR:
	2010
	WORK DESCRIPTION:
	<p>During the execution, the works carried out were technical assistance work, visiting work, writing records request documentation, monthly reporting, etc.</p>
	





WORK:	CUSTOMER:
T.A.W. and Health and safety in Almoradi	CIT
PROJECT NAME:	
CONDITIONING AND IMPROVEMENT CV-935 ROAD SECTION: URBAN AREA - POL. INDUSTRIAL "LAS MAROMAS "	 <p>GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT</p>
FILE No.:	
YEAR:	2008

WORK IN PICTURES:	WORK DESCRIPTION:
--------------------------	--------------------------




During the execution, the works carried out were health and safety control and technical assistance work, visiting work, writing records request documentation, monthly reporting, etc.


	DIARIO DE OBRA INSPECCIÓN GENERAL	Vigilante: <i>[Signature]</i> Hora entrada: <i>[Blank]</i> Hora salida: <i>[Blank]</i> Fecha: <i>[Blank]</i>
OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA CARRETERA CV-935. TRAMO: CASCO URBANO-POLIGONO INDUSTRIAL "LAS MAROMAS" ALMORADI (ALICANTE)		
TAJO: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Descripción:	ZONA:	Fecha inicio: Fecha fin:
INCIDENCIAS I SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Comentario:	Código:	
OBSERVACIONES: <i>[Handwritten notes]</i>		
MAQUINARIA:		Nº DE OPERARIOS:
ACTIVIDAD Nº1: <i>[Handwritten description]</i>	ZONA: 1, 2	CÓDIGO:
DESCRIPCIÓN: <i>[Handwritten description]</i>	TRAMO:	TERMINA EL DÍA: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
COMPROBACIÓN: OK <input type="checkbox"/> CORREGIR <input type="checkbox"/> CROQUIS AL DORSO <input type="checkbox"/> FOTOS: <input type="checkbox"/>	INSPECCIÓN NOTAS:	
GENERAL: <input type="checkbox"/> CUANTITATIVA: <input type="checkbox"/> CUALITATIVA: <input type="checkbox"/> SEG. Y SALUD: <input type="checkbox"/>	ACTIVIDAD Nº2:	
DESCRIPCIÓN:	ZONA:	CÓDIGO:
TRAMO:	TERMINA EL DÍA: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
COMPROBACIÓN: OK <input type="checkbox"/> CORREGIR <input type="checkbox"/> CROQUIS AL DORSO <input type="checkbox"/> FOTOS: <input type="checkbox"/>	INSPECCIÓN NOTAS:	
GENERAL: <input type="checkbox"/> CUANTITATIVA: <input type="checkbox"/> CUALITATIVA: <input type="checkbox"/> SEG. Y SALUD: <input type="checkbox"/>	ACTIVIDAD Nº3:	
DESCRIPCIÓN:	ZONA:	CÓDIGO:
TRAMO:	TERMINA EL DÍA: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
COMPROBACIÓN: OK <input type="checkbox"/> CORREGIR <input type="checkbox"/> CROQUIS AL DORSO <input type="checkbox"/> FOTOS: <input type="checkbox"/>	INSPECCIÓN NOTAS:	
GENERAL: <input type="checkbox"/> CUANTITATIVA: <input type="checkbox"/> CUALITATIVA: <input type="checkbox"/> SEG. Y SALUD: <input type="checkbox"/>		




WORK:	CUSTOMER:
08028 T.A.W. and Health and safety, CV-95	CIT
PROJECT NAME:	
CONSTRUCTION PROJECT OF A ROUNDABOUT WHICH CONECTS CV-95 – LOS INVERNADEROS	
	FILE No.:
	YEAR:
	2008
WORK IN PICTURES:	WORK DESCRIPTION:
	<p>During the execution, the works carried out were health and safety control and technical assistance work, visiting work, writing records request documentation, monthly reporting, etc.</p>
	 <p>ASUNTO: INFORME DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD RESPECTO AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL CONTRATISTA.</p> <p>El presente informe, se realiza con motivo de la revisión del Plan de Seguridad y Salud entregado por la empresa PASTOR MEDINA OBRAS PÚBLICAS S.L. para la obra <u>"Proyecto de construcción de la Rotonda de conexión de la CV-95 con la Urbanización SUS-A "Los Invernaderos" San Miquel Salinas (Alicante)"</u>. Esta revisión realizada por parte del Coordinador de Seguridad y Salud en la ejecución de las obras, precede a la posterior aprobación del propio Plan.</p> <p>Cabe de mencionar que en todos los documentos es necesaria la firma del Jefe de Obra, es decir, memoria, pliego, planos y presupuesto.</p> <p>Memoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> Al nombrar los centros asistenciales, se debe incluir el <u>itinerario</u> a seguir y la distancia existente mediante una imagen o croquis. (Pág. 9 y 149) Falta un <u>plan de obra</u> de la sucesión de los trabajos. (Pág 11) Definición del procedimiento de subcontratas Realizar una descripción de la metodología utilizada para la <u>investigación de accidentes</u>. Analizar los riesgos de las siguientes máquinas: <u>Dumper de Obra</u>, <u>Camión cesta</u> (para alumbrado) y <u>camión cuba</u> (riego). Incluir el análisis de las <u>máquinas de pintura</u> en el apartado de Maquinaria. <p>Pliego:</p> <ul style="list-style-type: none"> Introducir los <u>Reales Decretos</u> que modifican a los mencionados. Ampliar la <u>normativa referente a maquinaria</u>.










WORK:	CUSTOMER:	
07028 – T.A.W. EU-3. NoveldaUrbanization	A.I.U. UE-3 Industrial	
PROJECT NAME:		
T.A.W. IN URBANIZATION IMPLEMENTING IN THE EU 3 IN NOVELDA (ALICANTE).	FILE No.:	
	YEAR:	2007
WORK IN PICTURES:	WORK DESCRIPTION:	
	<p>During the execution, the works carried out were technical assistance work, visiting work, writing records request documentation, monthly reporting, etc.</p>	
		










WORK:	CUSTOMER:			
11020- HEALTH AND SAFETY, PASEO PONIENTE	Benidorm County			
PROJECT NAME:				
HEALTH AND SAFETY COORDINATION IN PASEOMARÍTIMO EXTENSION WORKS, IN WEST BEACH- ELCHE PARK SECTION, BENIDORM (ALICANTE)				
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="817 772 1074 831">FILE No.:</td> <td data-bbox="1074 772 1375 831"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="817 831 1074 884">YEAR:</td> <td data-bbox="1074 831 1375 884">2011-2012</td> </tr> </table>		FILE No.:		YEAR:
FILE No.:				
YEAR:	2011-2012			
WORK IN PICTURES:	WORK DESCRIPTION:			
	<p>During the execution, the works carried out were Health and safety control, visiting work, writing records request documentation, monthly reporting, etc.</p>			
				




WORK:	CUSTOMER:																																																																						
11009 – Heald and safety coord. - PAINTING	Benidorm County																																																																						
PROJECT NAME:																																																																							
HEALTH AND SAFETY COORDINATION IN WORKS OF ROAD SIGNS PAINTING IN BENIDORM																																																																							
FILE No.:																																																																							
YEAR:	2011																																																																						
WORK IN PICTURES:	WORK DESCRIPTION:																																																																						
 	<p>During the execution, the works carried out were Health and safety control, visiting work, writing records request documentation, monthly reporting, etc.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD DE ACTIVIDADES</th> <th colspan="2" style="text-align: right;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBRA: <i>CSS Red Seguridad</i></td> <td>HORA ENTRADA: <i>10:30</i></td> <td>FECHA: <i>13-12-2010</i></td> <td>HOJA: <i>1</i> DE <i>1</i></td> </tr> <tr> <td>TAJO: <i>Servicio de mantenimiento</i></td> <td>HORA SALIDA: <i>16:30</i></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDAD Nº: <i>1</i></td> <td>DEFICIENCIAS</td> <td colspan="2">MEDIDAS CORRECTIVAS</td> </tr> <tr> <td>1- Protecciones colectivas: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> <td rowspan="4"></td> <td colspan="2" rowspan="4"></td> </tr> <tr> <td>2- Protecciones individuales: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> </tr> <tr> <td>3- Condiciones de elevación de obra segura: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> </tr> <tr> <td>4- Orden e higiene: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> </tr> <tr> <td>Fotografías: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> <td colspan="3">Responsable de la actividad: <i>Implantación de Medidas Correctivas (COMPROMISO)</i></td> </tr> <tr> <td>Cargo:</td> <td colspan="3">Valoración de Seguridad y Salud de la Actividad (Según Técnica de Seguridad): <input checked="" type="checkbox"/> (1) Excelente (2) Muy Buena (3) Buena (4) Suficiente (5) Insuficiente (6) Inaceptable</td> </tr> <tr> <td>Observaciones:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDAD Nº: _____</td> <td>DEFICIENCIAS</td> <td colspan="2">MEDIDAS CORRECTIVAS</td> </tr> <tr> <td>1- Protecciones colectivas: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> <td rowspan="4"></td> <td colspan="2" rowspan="4"></td> </tr> <tr> <td>2- Protecciones individuales: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> </tr> <tr> <td>3- Condiciones de elevación de obra segura: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> </tr> <tr> <td>4- Orden e higiene: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> </tr> <tr> <td>Fotografías: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> <td colspan="3">Responsable de la actividad: <i>Implantación de Medidas Correctivas (COMPROMISO)</i></td> </tr> <tr> <td>Cargo:</td> <td colspan="3">Valoración de Seguridad y Salud de la Actividad (Según Técnica de Seguridad): <input type="checkbox"/> (1) Excelente (2) Muy Buena (3) Buena (4) Suficiente (5) Insuficiente (6) Inaceptable</td> </tr> <tr> <td>Observaciones:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Revisado por la Empresa:</td> <td colspan="2">El Técnico de Seguridad:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nombre: <i>Carlos Valero</i></td> <td colspan="2">Nombre: <i>Vicente Muñoz</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cargo: <i> jefe de obra</i></td> <td colspan="2">Firma:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD DE ACTIVIDADES				OBRA: <i>CSS Red Seguridad</i>	HORA ENTRADA: <i>10:30</i>	FECHA: <i>13-12-2010</i>	HOJA: <i>1</i> DE <i>1</i>	TAJO: <i>Servicio de mantenimiento</i>	HORA SALIDA: <i>16:30</i>			ACTIVIDAD Nº: <i>1</i>	DEFICIENCIAS	MEDIDAS CORRECTIVAS		1- Protecciones colectivas: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				2- Protecciones individuales: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	3- Condiciones de elevación de obra segura: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	4- Orden e higiene: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Fotografías: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Responsable de la actividad: <i>Implantación de Medidas Correctivas (COMPROMISO)</i>			Cargo:	Valoración de Seguridad y Salud de la Actividad (Según Técnica de Seguridad): <input checked="" type="checkbox"/> (1) Excelente (2) Muy Buena (3) Buena (4) Suficiente (5) Insuficiente (6) Inaceptable			Observaciones:				ACTIVIDAD Nº: _____	DEFICIENCIAS	MEDIDAS CORRECTIVAS		1- Protecciones colectivas: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				2- Protecciones individuales: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	3- Condiciones de elevación de obra segura: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	4- Orden e higiene: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Fotografías: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Responsable de la actividad: <i>Implantación de Medidas Correctivas (COMPROMISO)</i>			Cargo:	Valoración de Seguridad y Salud de la Actividad (Según Técnica de Seguridad): <input type="checkbox"/> (1) Excelente (2) Muy Buena (3) Buena (4) Suficiente (5) Insuficiente (6) Inaceptable			Observaciones:				Revisado por la Empresa:	El Técnico de Seguridad:			Nombre: <i>Carlos Valero</i>	Nombre: <i>Vicente Muñoz</i>			Cargo: <i> jefe de obra</i>	Firma:		
CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD DE ACTIVIDADES																																																																							
OBRA: <i>CSS Red Seguridad</i>	HORA ENTRADA: <i>10:30</i>	FECHA: <i>13-12-2010</i>	HOJA: <i>1</i> DE <i>1</i>																																																																				
TAJO: <i>Servicio de mantenimiento</i>	HORA SALIDA: <i>16:30</i>																																																																						
ACTIVIDAD Nº: <i>1</i>	DEFICIENCIAS	MEDIDAS CORRECTIVAS																																																																					
1- Protecciones colectivas: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																							
2- Protecciones individuales: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																							
3- Condiciones de elevación de obra segura: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																							
4- Orden e higiene: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																							
Fotografías: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Responsable de la actividad: <i>Implantación de Medidas Correctivas (COMPROMISO)</i>																																																																						
Cargo:	Valoración de Seguridad y Salud de la Actividad (Según Técnica de Seguridad): <input checked="" type="checkbox"/> (1) Excelente (2) Muy Buena (3) Buena (4) Suficiente (5) Insuficiente (6) Inaceptable																																																																						
Observaciones:																																																																							
ACTIVIDAD Nº: _____	DEFICIENCIAS	MEDIDAS CORRECTIVAS																																																																					
1- Protecciones colectivas: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																							
2- Protecciones individuales: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																							
3- Condiciones de elevación de obra segura: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																							
4- Orden e higiene: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																							
Fotografías: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Responsable de la actividad: <i>Implantación de Medidas Correctivas (COMPROMISO)</i>																																																																						
Cargo:	Valoración de Seguridad y Salud de la Actividad (Según Técnica de Seguridad): <input type="checkbox"/> (1) Excelente (2) Muy Buena (3) Buena (4) Suficiente (5) Insuficiente (6) Inaceptable																																																																						
Observaciones:																																																																							
Revisado por la Empresa:	El Técnico de Seguridad:																																																																						
Nombre: <i>Carlos Valero</i>	Nombre: <i>Vicente Muñoz</i>																																																																						
Cargo: <i> jefe de obra</i>	Firma:																																																																						




WORK:	CUSTOMER:																																																												
10055 – H. and S. in traffic light network	Benidorm County																																																												
PROJECT NAME:																																																													
HEALTH AND SAFETY COORDINATION IN THE TRAFFIC LIGHT NETWORK IMPROVEMENT, AND IN THE TRAFFIC REGULATION IN BENIDORM (ALICANTE)																																																													
FILE No.:																																																													
YEAR:	2010																																																												
WORK IN PICTURES:	WORK DESCRIPTION:																																																												
 	<p>During the execution, the works carried out were Health and safety control, visiting work, writing records request documentation, monthly reporting, etc.</p>																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD DE ACTIVIDADES</th> <th colspan="2" style="text-align: right;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"> <small>OBRA:</small> <i>Csa Red Seguridad</i> <small>PROYECTO:</small> <i>ROSSA-20055-10</i> </td> </tr> <tr> <td><small>TAJO:</small> <i>Severo Gela - Zorras</i></td> <td><small>HORA ENTRADA:</small> <i>10:30</i></td> <td><small>FECHA:</small> <i>13-12-2010</i></td> <td><small>HORA SALIDA:</small> <i>10:50</i></td> </tr> <tr> <td><small>ACTIVIDAD N°:</small> <i>1</i></td> <td style="text-align: center;"><small>DEFICIENCIAS</small></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><small>MEDIDAS CORCTORAS</small></td> </tr> <tr> <td> 1- Protecciones colectivas: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 2- Protecciones individuales: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 3- Condiciones de ejecución de obra segura: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 4- Orden y limpieza: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Fotografías: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO </td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><small>Responsable de la actividad:</small></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><small>Implementación de Medidas Correctoras (COMPROMISO):</small></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><small>Cargo:</small></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><small>Valoración de Seguridad y Salud de la Actividad (Según Técnico de Seguridad):</small> <input checked="" type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> (4) <input type="checkbox"/> (5) <input type="checkbox"/> (6) <input type="checkbox"/> (7) <input type="checkbox"/> (8) <input type="checkbox"/> (9) <input type="checkbox"/> (10)</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><small>Observaciones:</small></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><small>Revisado por la Empresa:</small></td> <td colspan="2"><small>El Técnico de Seguridad:</small></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><small>Nombre:</small> <i>Carlos Valero</i></td> <td colspan="2"><small>(Firma):</small> <i>Vicente Muñoz</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><small>Cargo:</small> <i>coorje de obra</i></td> <td colspan="2"><small>Nombre:</small> <i>Vicente Muñoz</i></td> </tr> </tbody> </table>		CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD DE ACTIVIDADES				<small>OBRA:</small> <i>Csa Red Seguridad</i> <small>PROYECTO:</small> <i>ROSSA-20055-10</i>				<small>TAJO:</small> <i>Severo Gela - Zorras</i>	<small>HORA ENTRADA:</small> <i>10:30</i>	<small>FECHA:</small> <i>13-12-2010</i>	<small>HORA SALIDA:</small> <i>10:50</i>	<small>ACTIVIDAD N°:</small> <i>1</i>	<small>DEFICIENCIAS</small>	<small>MEDIDAS CORCTORAS</small>		1- Protecciones colectivas: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 2- Protecciones individuales: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 3- Condiciones de ejecución de obra segura: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 4- Orden y limpieza: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Fotografías: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				<small>Responsable de la actividad:</small>		<small>Implementación de Medidas Correctoras (COMPROMISO):</small>		<small>Cargo:</small>				<small>Valoración de Seguridad y Salud de la Actividad (Según Técnico de Seguridad):</small> <input checked="" type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> (4) <input type="checkbox"/> (5) <input type="checkbox"/> (6) <input type="checkbox"/> (7) <input type="checkbox"/> (8) <input type="checkbox"/> (9) <input type="checkbox"/> (10)				<small>Observaciones:</small>																<small>Revisado por la Empresa:</small>		<small>El Técnico de Seguridad:</small>		<small>Nombre:</small> <i>Carlos Valero</i>		<small>(Firma):</small> <i>Vicente Muñoz</i>		<small>Cargo:</small> <i>coorje de obra</i>		<small>Nombre:</small> <i>Vicente Muñoz</i>	
CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD DE ACTIVIDADES																																																													
<small>OBRA:</small> <i>Csa Red Seguridad</i> <small>PROYECTO:</small> <i>ROSSA-20055-10</i>																																																													
<small>TAJO:</small> <i>Severo Gela - Zorras</i>	<small>HORA ENTRADA:</small> <i>10:30</i>	<small>FECHA:</small> <i>13-12-2010</i>	<small>HORA SALIDA:</small> <i>10:50</i>																																																										
<small>ACTIVIDAD N°:</small> <i>1</i>	<small>DEFICIENCIAS</small>	<small>MEDIDAS CORCTORAS</small>																																																											
1- Protecciones colectivas: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 2- Protecciones individuales: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 3- Condiciones de ejecución de obra segura: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO 4- Orden y limpieza: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Fotografías: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																													
<small>Responsable de la actividad:</small>		<small>Implementación de Medidas Correctoras (COMPROMISO):</small>																																																											
<small>Cargo:</small>																																																													
<small>Valoración de Seguridad y Salud de la Actividad (Según Técnico de Seguridad):</small> <input checked="" type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> (4) <input type="checkbox"/> (5) <input type="checkbox"/> (6) <input type="checkbox"/> (7) <input type="checkbox"/> (8) <input type="checkbox"/> (9) <input type="checkbox"/> (10)																																																													
<small>Observaciones:</small>																																																													
<small>Revisado por la Empresa:</small>		<small>El Técnico de Seguridad:</small>																																																											
<small>Nombre:</small> <i>Carlos Valero</i>		<small>(Firma):</small> <i>Vicente Muñoz</i>																																																											
<small>Cargo:</small> <i>coorje de obra</i>		<small>Nombre:</small> <i>Vicente Muñoz</i>																																																											




WORK:	CUSTOMER:
10051 – H&S COORDINATION- RURAL AREAS	Benidorm County
PROJECT NAME:	
HEALTH AND SAFETY COORDINATION WORKS FOR THE ROAD SAFETY IMPROVEMENT IN DIFFERENT RURAL AREAS IN BENIDORM, ALICANTE	
FILE No.:	
YEAR:	2010
WORK IN PICTURES:	WORK DESCRIPTION:
 	<p>During the execution, the works carried out were Health and safety control, visiting work, writing records request documentation, monthly reporting, etc.</p> 










WORK:	CUSTOMER:												
10050 – H&S COORDINATION BILBAO AVENUE	Benidorm County												
PROJECT NAME:													
HEALTH AND SAFETY COORDINATION IN ENERGETIC EFFICIENCY IMPROVEMENT WORKS, IN PUBLIC STREET LIGHTING IN BILBAO AVENUE, BENIDORM (ALICANTE)													
FILE No.:													
	YEAR: 2010												
WORK IN PICTURES:	WORK DESCRIPTION:												
	<p>During the execution, the works carried out were Health and safety control, visiting work, writing records request documentation, monthly reporting, etc.</p> <div data-bbox="858 1124 1342 1509"> <p style="text-align: center;">CONTROL DIARIO </p> <hr/> <p>ACTIVIDAD: Canalización alumbrado FECHA: 04/10/2010</p> <hr/> <p>DESCRIPCIÓN: Se recuerda la necesidad de dejar la obra cerrada al finalizar la jornada.</p> <p>CONTROLES REALIZADOS:</p> <table border="0"> <tr> <td>Control General/Actividad: <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Control Maquinaria: <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Control Personal: <input type="checkbox"/></td> <td>Control Uso Maquinaria: <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>RESUMEN CONTROL:</p> <table border="0"> <tr> <td>Protecciones Colectivas: <input checked="" type="checkbox"/></td> <td rowspan="3" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Actividad Correcta: <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Protecciones Individuales: <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Condiciones Obra Segura: <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>DEFICIENCIAS (Y MEDIDAS A ADOPTAR): No</p> <p>VALORACIÓN DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD: Buena</p> <hr/> <p>FOTOGRAFÍAS:</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Foto 1 <small>Vista de zona de obras</small></td> <td style="text-align: center;">Foto 2 <small>Vista de zona de obras</small></td> </tr> </table> </div>	Control General/Actividad: <input checked="" type="checkbox"/>	Control Maquinaria: <input type="checkbox"/>	Control Personal: <input type="checkbox"/>	Control Uso Maquinaria: <input type="checkbox"/>	Protecciones Colectivas: <input checked="" type="checkbox"/>	Actividad Correcta: <input checked="" type="checkbox"/>	Protecciones Individuales: <input checked="" type="checkbox"/>	Condiciones Obra Segura: <input checked="" type="checkbox"/>			Foto 1 <small>Vista de zona de obras</small>	Foto 2 <small>Vista de zona de obras</small>
Control General/Actividad: <input checked="" type="checkbox"/>	Control Maquinaria: <input type="checkbox"/>												
Control Personal: <input type="checkbox"/>	Control Uso Maquinaria: <input type="checkbox"/>												
Protecciones Colectivas: <input checked="" type="checkbox"/>	Actividad Correcta: <input checked="" type="checkbox"/>												
Protecciones Individuales: <input checked="" type="checkbox"/>													
Condiciones Obra Segura: <input checked="" type="checkbox"/>													
													
Foto 1 <small>Vista de zona de obras</small>	Foto 2 <small>Vista de zona de obras</small>												
													




WORK:	CUSTOMER:																																																																																																								
10049 – H&S in FIBER OPTIC WORKS	Benidorm County																																																																																																								
PROJECT NAME:																																																																																																									
HEALTH AND SAFETY COORDINATION IN THE FIBER OPTICAL COMMUNICATION LOCAL NETWORK EXTENSION WORKS.																																																																																																									
FILE No.:																																																																																																									
YEAR:	2010																																																																																																								
WORK IN PICTURES:	WORK DESCRIPTION:																																																																																																								
	<p>During the execution, the works carried out were Health and safety control, visiting work, writing records request documentation, monthly reporting, etc.</p>																																																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD GENERAL</th> <th colspan="2">isimat</th> </tr> <tr> <td colspan="2">OBRA: CSS Fibra Óptica</td> <td>RO/SG - 10049 - Nº 01</td> <td>F-87 v.1</td> </tr> <tr> <td>TÍTULO: Avda. Dringo I</td> <td>HORA ENTRADA: 10:30</td> <td>FECHA: 9/8/2010</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Urgente: Menos de una hora o interrumpido la actividad</td> <td>HORA SALIDA: 11:05</td> <td>HEXA: 4 de 4</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Intervalo: Menos de 24 horas</td> <td>Ciclo: Fases Menos de 12</td> <td>Ciclo: 0 (desconocido)</td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDAD / INSTALACIÓN Nº 1</td> <td>BUEN ESTADO GENERAL</td> <td colspan="2">URGENCIA DE LA ADOCIÓN</td> </tr> <tr> <td>Designación: Corto de acceso</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Urgente</td> </tr> <tr> <td>Personal: 2 trabajadores</td> <td>DEFICIENCIAS</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Inmediato</td> </tr> <tr> <td>Máquinaria:</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Corto Plazo</td> </tr> <tr> <td>Medios auxiliares: Combustor</td> <td>Actividad Correcta:</td> <td colspan="2"><input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Observaciones: + Falta problemas individuales.</td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDAD / INSTALACIÓN Nº _____</td> <td>BUEN ESTADO GENERAL</td> <td colspan="2">URGENCIA DE LA ADOCIÓN</td> </tr> <tr> <td>Designación:</td> <td><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Urgente</td> </tr> <tr> <td>Personal:</td> <td>DEFICIENCIAS</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Inmediato</td> </tr> <tr> <td>Máquinaria:</td> <td><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Corto Plazo</td> </tr> <tr> <td>Medios auxiliares:</td> <td>Actividad Correcta:</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Observaciones:</td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDAD / INSTALACIÓN Nº _____</td> <td>BUEN ESTADO GENERAL</td> <td colspan="2">URGENCIA DE LA ADOCIÓN</td> </tr> <tr> <td>Designación:</td> <td><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Urgente</td> </tr> <tr> <td>Personal:</td> <td>DEFICIENCIAS</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Inmediato</td> </tr> <tr> <td>Máquinaria:</td> <td><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> Corto Plazo</td> </tr> <tr> <td>Medios auxiliares:</td> <td>Actividad Correcta:</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Observaciones:</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <small>A su vez debe hacer legar copia de este documento a:</small> <input type="checkbox"/> Coordinador en materia Preventiva <input type="checkbox"/> Empresa Principal o Titular del Centro <input type="checkbox"/> Delegados de Prevención <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Trabajadores autónomos implicados <input type="checkbox"/> Subcontratistas implicados </td> </tr> <tr> <td>Revisado por la Empresa:</td> <td>Nombre:</td> <td colspan="2">El Técnico de Seguridad:</td> </tr> <tr> <td>Firma de la Empresa:</td> <td>Cargo:</td> <td colspan="2">  Nombre: Vicente Mates </td> </tr> </thead></table>	CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD GENERAL		isimat		OBRA: CSS Fibra Óptica		RO/SG - 10049 - Nº 01	F-87 v.1	TÍTULO: Avda. Dringo I	HORA ENTRADA: 10:30	FECHA: 9/8/2010		Urgente: Menos de una hora o interrumpido la actividad	HORA SALIDA: 11:05	HEXA: 4 de 4			Intervalo: Menos de 24 horas	Ciclo: Fases Menos de 12	Ciclo: 0 (desconocido)	ACTIVIDAD / INSTALACIÓN Nº 1	BUEN ESTADO GENERAL	URGENCIA DE LA ADOCIÓN		Designación: Corto de acceso	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Urgente		Personal: 2 trabajadores	DEFICIENCIAS	<input type="checkbox"/> Inmediato		Máquinaria:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Corto Plazo		Medios auxiliares: Combustor	Actividad Correcta:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Observaciones: + Falta problemas individuales.				ACTIVIDAD / INSTALACIÓN Nº _____	BUEN ESTADO GENERAL	URGENCIA DE LA ADOCIÓN		Designación:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Urgente		Personal:	DEFICIENCIAS	<input type="checkbox"/> Inmediato		Máquinaria:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Corto Plazo		Medios auxiliares:	Actividad Correcta:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Observaciones:				ACTIVIDAD / INSTALACIÓN Nº _____	BUEN ESTADO GENERAL	URGENCIA DE LA ADOCIÓN		Designación:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Urgente		Personal:	DEFICIENCIAS	<input type="checkbox"/> Inmediato		Máquinaria:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Corto Plazo		Medios auxiliares:	Actividad Correcta:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Observaciones:				<small>A su vez debe hacer legar copia de este documento a:</small> <input type="checkbox"/> Coordinador en materia Preventiva <input type="checkbox"/> Empresa Principal o Titular del Centro <input type="checkbox"/> Delegados de Prevención <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Trabajadores autónomos implicados <input type="checkbox"/> Subcontratistas implicados				Revisado por la Empresa:	Nombre:	El Técnico de Seguridad:		Firma de la Empresa:	Cargo:	 Nombre: Vicente Mates	
CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD GENERAL		isimat																																																																																																							
OBRA: CSS Fibra Óptica		RO/SG - 10049 - Nº 01	F-87 v.1																																																																																																						
TÍTULO: Avda. Dringo I	HORA ENTRADA: 10:30	FECHA: 9/8/2010																																																																																																							
Urgente: Menos de una hora o interrumpido la actividad	HORA SALIDA: 11:05	HEXA: 4 de 4																																																																																																							
	Intervalo: Menos de 24 horas	Ciclo: Fases Menos de 12	Ciclo: 0 (desconocido)																																																																																																						
ACTIVIDAD / INSTALACIÓN Nº 1	BUEN ESTADO GENERAL	URGENCIA DE LA ADOCIÓN																																																																																																							
Designación: Corto de acceso	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Urgente																																																																																																							
Personal: 2 trabajadores	DEFICIENCIAS	<input type="checkbox"/> Inmediato																																																																																																							
Máquinaria:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Corto Plazo																																																																																																							
Medios auxiliares: Combustor	Actividad Correcta:	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																																																							
Observaciones: + Falta problemas individuales.																																																																																																									
ACTIVIDAD / INSTALACIÓN Nº _____	BUEN ESTADO GENERAL	URGENCIA DE LA ADOCIÓN																																																																																																							
Designación:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Urgente																																																																																																							
Personal:	DEFICIENCIAS	<input type="checkbox"/> Inmediato																																																																																																							
Máquinaria:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Corto Plazo																																																																																																							
Medios auxiliares:	Actividad Correcta:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																																																							
Observaciones:																																																																																																									
ACTIVIDAD / INSTALACIÓN Nº _____	BUEN ESTADO GENERAL	URGENCIA DE LA ADOCIÓN																																																																																																							
Designación:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Urgente																																																																																																							
Personal:	DEFICIENCIAS	<input type="checkbox"/> Inmediato																																																																																																							
Máquinaria:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Corto Plazo																																																																																																							
Medios auxiliares:	Actividad Correcta:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO																																																																																																							
Observaciones:																																																																																																									
<small>A su vez debe hacer legar copia de este documento a:</small> <input type="checkbox"/> Coordinador en materia Preventiva <input type="checkbox"/> Empresa Principal o Titular del Centro <input type="checkbox"/> Delegados de Prevención <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Trabajadores autónomos implicados <input type="checkbox"/> Subcontratistas implicados																																																																																																									
Revisado por la Empresa:	Nombre:	El Técnico de Seguridad:																																																																																																							
Firma de la Empresa:	Cargo:	 Nombre: Vicente Mates																																																																																																							



WORK:	CUSTOMER:
10040 – H&S WORKS IN THE CALA –WEST AREA	Benidorm County
PROJECT NAME:	
HEALTH AND SAFETY COORDINATION IN ROAD SAFETY AND MOBILITY IMPROVING WORKS IN LA CALA – WEST AREA, BENIDORM (ALICANTE)	
WORK IN PICTURES:	FILE No.:
	YEAR: 2010
	WORK DESCRIPTION:
	<p>During the execution, the works carried out were Health and safety control, visiting work, writing records request documentation, monthly reporting, etc.</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>AYUNTAMIENTO BENIDORM SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES</p>  </div> </div> <p style="text-align: center;"><u>COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCIÓN</u></p> <p style="text-align: center;"><u>“Mejora Movilidad y Seguridad vial en La Cala – Poniente de Benidorm”</u></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: right;">JUNIO-DICIEMBRE 2010</p>



WORK:	CUSTOMER:
10032 – H&S Coord. Centre Zone - Benidorm Coast	Benidorm County
PROJECT NAME:	
HEALTH AND SAFETY COORDINATION IN ROAD SAFETY AND MOBILITY IMPROVING WORKS IN CENTER AREA- BENIDORM COAST, BENIDORM (ALICANTE)	
FILE No.:	
YEAR:	2010
WORK IN PICTURES:	WORK DESCRIPTION:



During the execution, the works carried out were Health and safety control, visiting work, writing records request documentation, monthly reporting, etc.



AYUNTAMIENTO BENIDORM
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES




COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EJECUCIÓN

“Mejora Movilidad y Seguridad vial en zona
Centro - Levante de Benidorm”



MAYO-JUNIO 2010



WORK:	CUSTOMER:	
09031 H&S Coord. CALVARRI	Benidorm County	
PROJECT NAME:		
EL CALVARI DISTRICT COMPREHENSIVE RENOVATION		
	FILE No.:	
	YEAR:	2009
WORK IN PICTURES:	WORK DESCRIPTION:	

CONTROL DIARIO 

ACTIVIDAD: Apertura de carga **FECHA:** 02/07/2009

DESCRIPCIÓN:
Resgate: R0150-09031-1P33

CONTROLES REALIZADOS:

Control General/Actividad: <input checked="" type="checkbox"/>	Control Maquinaria: <input type="checkbox"/>
Control Personal: <input type="checkbox"/>	Control Uso Maquinaria: <input type="checkbox"/>

RESUMEN CONTROL:

Protecciones Colectivas: <input checked="" type="checkbox"/>	Actividad Correcta: <input checked="" type="checkbox"/>
Protecciones Individuales: <input checked="" type="checkbox"/>	
Condiciones Cebra Segura: <input checked="" type="checkbox"/>	

DEFICIENCIAS (Y MEDIDAS A ADOPTAR): No

VALORACIÓN DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD: Buena

FOTOGRAFÍAS:



Foto 1
En esta fotografía se observa a una excavadora operando una zanja en la C/ de los Clavos y se ve el carril como aparece los escombros.



Foto 2
En la imagen podemos observar al servicio de la carga tras la labor de la excavación.

CBS Benidorm Calvari Página 1 de 30




AYUNTAMIENTO BENIDORM
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES






COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EJECUCIÓN


“Renovación integral Barrio El Calvari”




MAYO 2009



WORK:	CUSTOMER:
H&S Control in Old Quarter of Benidorm	Benidorm County
PROJECT NAME:	
MOBILITY AND ACCESSIBILITY IMPROVEMENT IN "SOL" STREET	
WORK IN PICTURES:	
  	FILE No.: YEAR: 2009
	WORK DESCRIPTION: <p>During the execution, the works carried out were Health and safety control, including visiting work, writing records request documentation, monthly reporting, etc.</p> <div style="text-align: center;">    </div> <p><u>COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCIÓN</u></p> <p><u>"Mejora Movilidad y Accesibilidad en Calle Sol"</u></p>  <p style="text-align: right;">JULIO 2009</p>



WORK:	CUSTOMER:
08029 H&S Works in CREUETA	GeneralitatValenciana Railways
PROJECT NAME:	
<p>REQUIRED OPERATIONS FOR THE TRACK SECTION BETWEEN CREUETA AND CAMPELLO OPTIMIZATION. (ALICANTE-DENIA LINE)</p>	
<p>FILE No.:</p> <p>YEAR: 2008</p>	
WORK IN PICTURES:	WORK DESCRIPTION:
<p><i>CONTROL DIARIO</i></p>  <p>FECHA: 29/07/2008 ACTIVIDAD: Neutralización de tensiones en vía</p> <p>DESCRIPCIÓN: La actividad se desarrolla en las proximidades del apeadero de Cala Pítreas. Durante el tiempo transcurrido en la visita se realiza el corte y tensado de primer carril.</p> <p>RESUMEN CONTROL: La actividad se ha desarrollado como en situaciones anteriores en lo que respecta a las condiciones de seguridad y salud. Por tanto, y ya que no se ha detectado ninguna deficiencia, la actividad se considera correcta.</p> <p>ACTIVIDAD CORRECTA <input checked="" type="checkbox"/> BUEN ESTADO GENERAL <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>FOTOGRAFÍAS:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="269 1184 469 1323">  <p>FOTO 1 Fotografía de la colocación de los rodillos entre el carril y la traviesa.</p> </div> <div data-bbox="477 1184 676 1323">  <p>FOTO 2 Imagen del carro de transporte de material; se observan los utensilios de trabajo que se utilizan.</p> </div> </div> <p style="text-align: right;"><small>Página 1 de 10</small></p>	<p>During the execution, the works carried out were Health and safety control, including visiting work, writing records request documentation, monthly reporting, etc.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">OPERACIONES NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL TRAMO DE VÍA ENTRE EL CAMPELLO Y CREUETA, LÍNEA DE ALICANTE A DENIA</p>
<p>FECHA: 31/07/2008 ACTIVIDAD: Neutralización de tensiones en vía</p> <p>DESCRIPCIÓN: La actividad se realiza entre las Estaciones de El Campello y Pueblo Español. La soldadura se ejecuta en la vía par, existiendo en tráfico ferroviario en la vía opuesta. La actividad se desarrolla con la vigilancia del piloto de vía.</p> <p>RESUMEN CONTROL: Las condiciones de seguridad evaluadas en el control, son correctas y adecuadas a las actividades que se desarrollan. Cabe destacar la vigilancia del piloto de vía, elemento fundamental en el desarrollo de los trabajos. Las protecciones colectivas e individuales son las adecuadas de igual forma que en visitas anteriores.</p> <p>ACTIVIDAD CORRECTA <input checked="" type="checkbox"/> BUEN ESTADO GENERAL <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>FOTOGRAFÍAS:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="260 1749 469 1901">  <p>FOTO 1 Imagen del enfriamiento de la soldadura.</p> </div> <div data-bbox="477 1749 684 1901">  <p>FOTO 2 Se observa en la fotografía el corte inicial del carril para la posterior soldadura.</p> </div> </div>	<p style="text-align: center;">COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCIÓN</p> <p style="text-align: right;">AGOSTO 2008</p>



WORK:	CUSTOMER:
07048 – H&S, St. Philip Neri new crossover	Infraestructure and Transport Ministry
PROJECT NAME:	
HEALTH AND SAFETY COORD. IN SAN FELIPE NERI NEW CROSSOVER WORKS (CREVILLENTE)	
FILE No.:	
	YEAR: 2008
WORK IN PICTURES:	WORK DESCRIPTION:
	<p>During the execution, the works carried out were Health and safety control, including visiting work, writing records request documentation, monthly reporting, etc.</p>
	

